

Statusbericht für Bauherr Nr.: 17 (Stand: 30. Juni 2023)

1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad, Duschen und Lüftung). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Diese Woche wurde die Neuverlegungen der Fernheizung, Netzwasser umgesetzt. Strom und Glasfaserkabel werden nächste Woche verlegt. Diese Woche wurde die Dampfsperre und Dämmung im Garderobentrackt eingebaut. Ab dem 03.07.23 wird die Bodenheizung verlegt.

1.3 Foto

Die Arbeiten mit dem Wiederaufbau (Beckenumfang anbetonieren) wurde diese Woche fortgesetzt und kann nächste Woche abgeschlossen werden. Rechtzeitig für die Montagearbeiten der Firma Berndorf am 11.07.23.

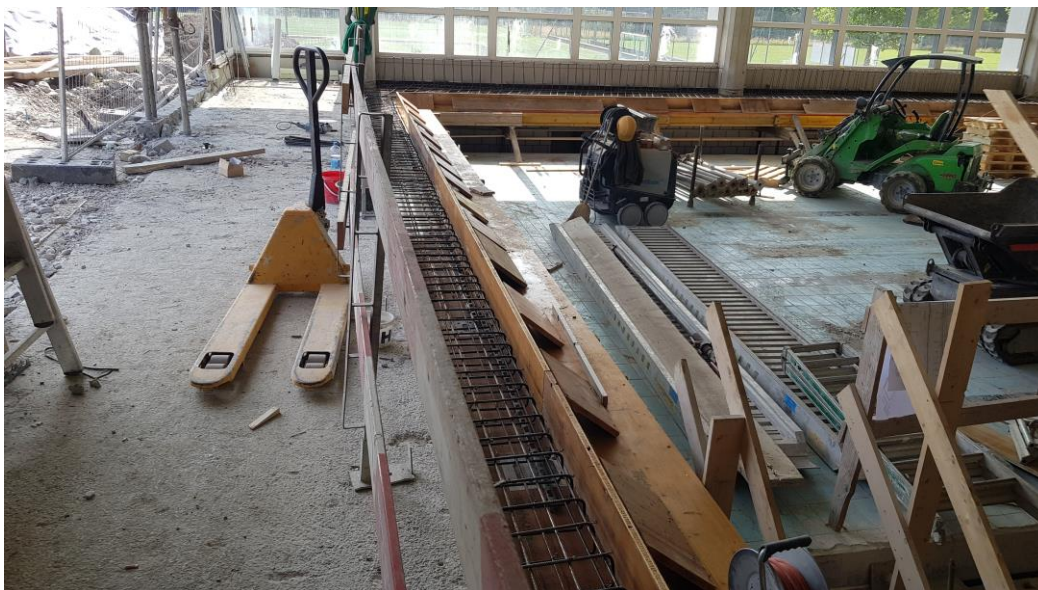


HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Mit der Montage vom Monoblock wurde diese Woche begonnen.



Laufende Elektroinstallationen.

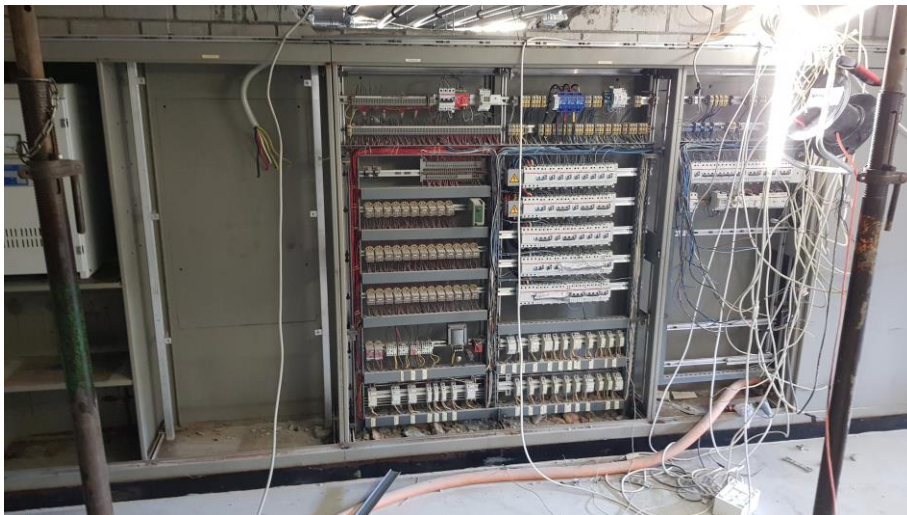

HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Der Aushub für den neuen Leitungsanschluss (Fernwärme, Netzwasser, Strom) ist abgeschlossen. Letzte Leitungen (Strom) werden noch eingelegt. Danach Abnahme und wieder Grabenschliessung.



Beim Vorraum vom Lift fehlt nur noch die Decke. Es gab einen Unterbruch wegen dem Einbau der Dampfsperre und Dämmung in den Garderoben.



Winterthur, 30. Juni 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
