

Statusbericht für Bauherr Nr.: 25 (Stand: 25. August 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG nahm die Arbeiten ab dem 07.08.23 wieder auf (Aussenarbeiten am Anbau und dem neuen Fortluftschacht). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Nächste Woche wird der UB in den Duschen eingebaut und die Firma Baumann wird mit den Plattenarbeiten starten. Ferner wird die Firma MS Faustino Gips GmbH mit Grundputzarbeiten beginnen.

1.3 Foto

Die Firma Berndorf montierte diese Woche die Treppe. Der nächste Einsatz (Montage der Beckenwände und Dichtungswinkel wird in der KW 43 ausgeführt.




HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Umleitung und Neuverlegung der Fernwärmeleitungen wurden diese Woche ausgeführt.



Die Montagearbeiten bei den Duschen sind grösstenteils abgeschlossen. Mit den Arbeiten für den Einbau vom UB wurde diese Woche begonnen.

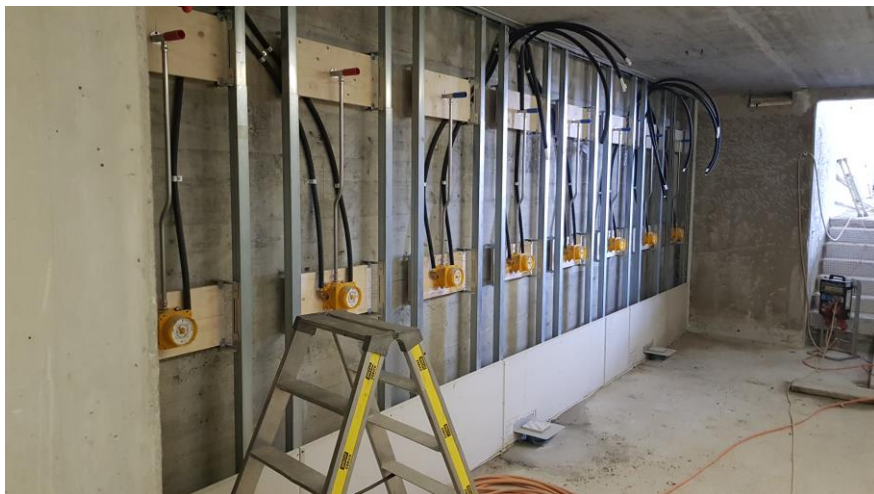

Winterthur, 25. August 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
