

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 16 (Stand: 23. Juni 2023)

### 1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad, Duschen und Lüftung). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Diese Woche wurde mit den Grabarbeiten für Neuverlegungen der Fernheizung, Netzwasser, Strom und Glasfaserkabel begonnen. In der nächsten Woche wird mit dem Einbau der Dampfsperre und Dämmung im Garderobentrack begonnen.

### 1.3 Foto

Die Arbeiten mit dem Wiederaufbau (Beckenumgang anbetonieren) wurde diese Woche fortgesetzt. Die Fertigstellung bis zum 11.07.23 sollte eingehalten werden können.

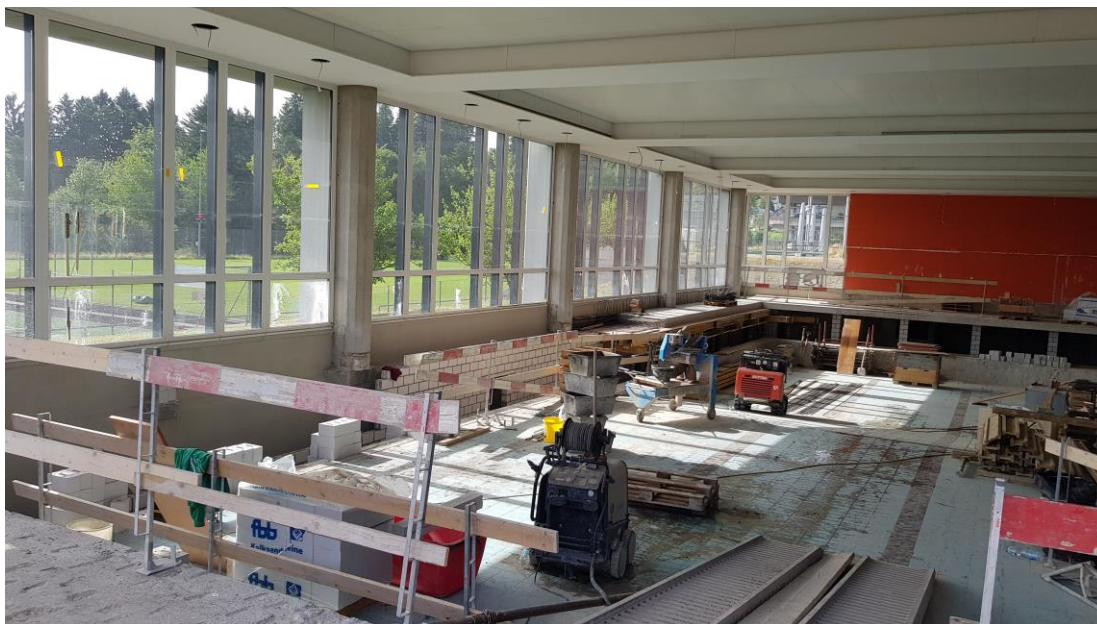

## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Der Rückbau des alten Fortluftschachtes läuft.



Mit den Mauerarbeiten für den Vorraum konnte diese Woche gestartet werden.





## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Mit dem Aushub für den neuen Leitungsanschluss (Fernwärme, Netzwasser, Strom) wurde diese Woche begonnen.



Der Rückbau der bestehenden Treppe ist abgeschlossen.



Winterthur, 23. Juni 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
