

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 13 (Stand: 02. Juni 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort. Abschluss der Montagearbeiten in den Garderoben diese Woche. Die Arbeiten in den Duschen beginnt in der kommenden Woche. Die Firma MS Faustino Gips GmbH wird in der nächsten Woche mit den Verputzarbeiten im Lüftungskanal an der Fensterfront starten.


### 1.3 Foto

Die Schneidarbeiten am Becken sind zum grössten Teil abgeschlossen und es wird jetzt mit dem Wiederaufbau begonnen (Stützen und Tragemauer, Beckenumgang anbetonieren).



## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Stufen der neuen Aussentreppe wurden fertig erstellt.

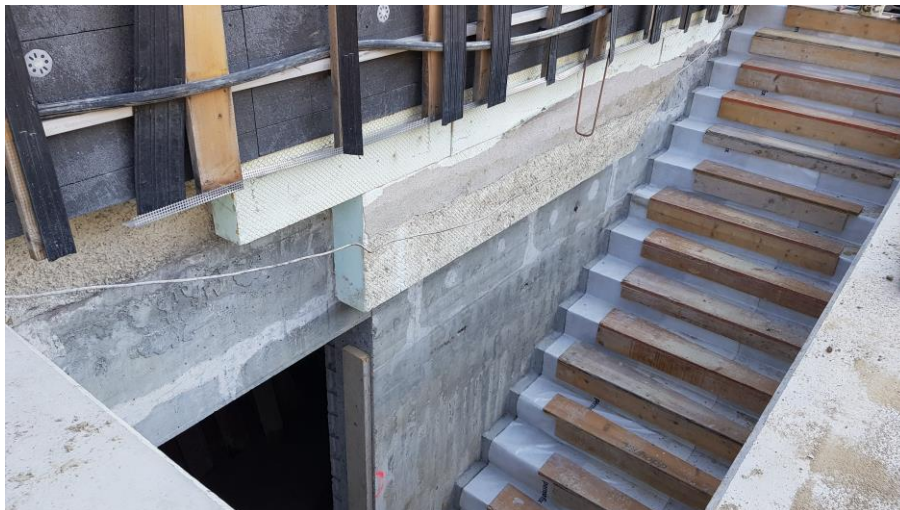

Die Bohrungen und Schneidarbeiten im neuen BWA-Technikraum sind abgeschlossen.



Winterthur, 02. Juni 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
