

Statusbericht für Bauherr Nr.: 18 (Stand: 07. Juli 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten diese Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad, Lüftungskanal, Leitungsbau). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Diese Woche wurde die Neuverlegungen der Fernheizung, Netzwasser umgesetzt. Strom und Glasfaserkabel werden nächste Woche verlegt. Diese Woche wurde die Bodenheizung im Garderobentrackt eingebaut. Am 07.07.23 wird der UB eingebaut.

1.3 Foto

Die Arbeiten mit dem Wiederaufbau (Beckenumfang anbetonieren) wurde diese Woche fortgesetzt und konnten abgeschlossen werden. Die Firma Berndorf wird am 11.07.23 mit den Montagearbeiten starten.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Montagearbeiten am Monoblock wurden diese Woche fortgesetzt.




Laufende Elektroinstallationen.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Diese Woche wurde die Bodenheizung in der Garderobe verlegt und am 07.07.23 wird der UB eingebaut.

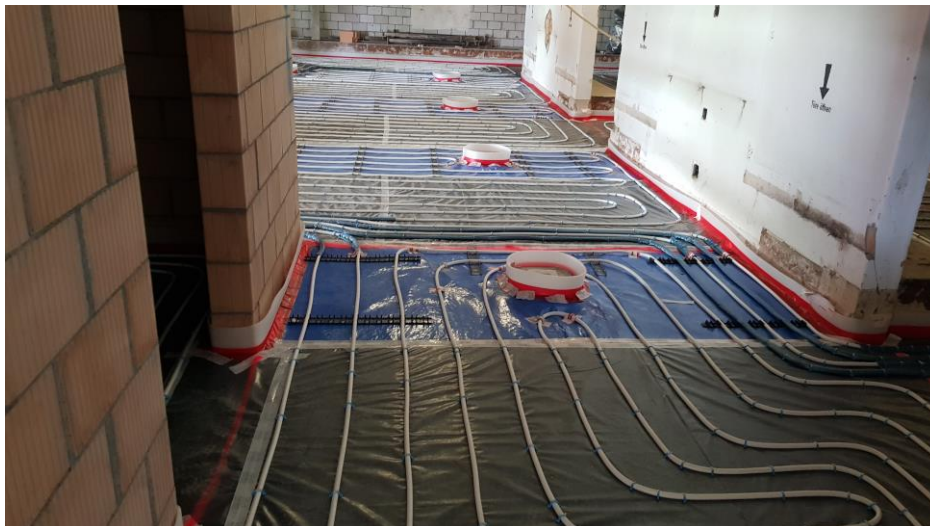

Die Kanalisation im ehemaligen Tankraum wurde eingebaut die Bodenplatte wieder vergossen. Die nächsten Arbeiten werden die Erstellung der Betonsockel für die BWA sein.



Winterthur, 07. Juli 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
