

Statusbericht für Bauherr Nr.: 26 (Stand: 01. September 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau und dem neuen Fortluftschacht). Die Firma Fatzer AG setzte die Heizungsinstallationen weiter fort (Bodenheizung). Der Einbau vom UB und der Bodenheizung verzögert sich wegen einem Wassereinbruch (siehe Seite 2). Firma Baumann wird nächste Woche voraussichtlich mit den Plattenarbeiten starten (reduziert wegen dem Wassereinbruch). Ferner wird die Firma MS Faustino Gips GmbH mit Grundputzarbeiten beginnen. Ab dem 15.09.23 wird die Firma Bawatec GmbH mit Installationen der BWA-Technik starten.


1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG begann diese Woche mit dem Fundamentaufbau für den Anbau. Erste Lage der Bodenplatte wird nächste Woche betoniert. Danach werden die Einlagen für die BWA-Technik installiert.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die schon verlegte Abdichtung und Dämmung wie auch die montierte Bodenheizung in den Duschen musste auf Grund von eindringendem Wasser (Ursache noch unbekannt) gestoppt werden. Die Termine für den Einbau vom UB und die nachfolgenden Plattenarbeiten verzögern sich daher (Dauer noch ungewiss).

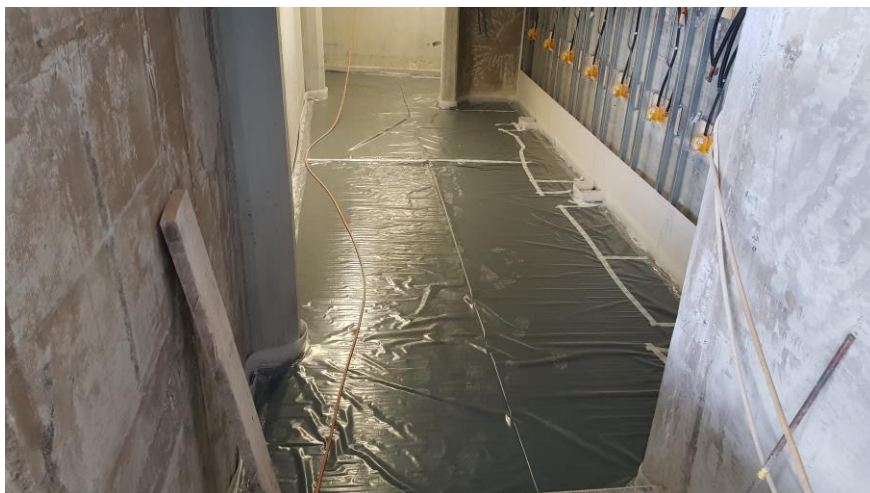

Die Arbeiten im Aussenbereich von der neuen Fortluft und Nottreppe wurden diese Woche fortgesetzt.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Gipsarbeiten starten in der nächsten Woche in den Garderoben (Grundputzarbeiten, Wiederaufbau, Rückbauten).



Für das zukünftige Büro muss zeitnahe ein Konzept erstellt werden (Beleuchtung, Bodenaufbau, Möblierung, Belüftung).



Winterthur, 01. September 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
