

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 30 (Stand: 29. September 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau). Die Firma Bawatec GmbH setzte die Installationen in der BWA-Technik fort. Diese Arbeiten werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Die Firma E3 HKL AG begann mit der Montage der Lüftungskanäle im EG. und UG. Die Firma Baumann begann mit den Plattenarbeiten in der Zivilschutzanlage.


### 1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte diese Woche die Montagearbeiten der Wandschalungen für den Anbau fort.




## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Im Technikraum der BWA wurde die Aufbauarbeiten der Becken fortgesetzt. Die Arbeiten dauern den ganzen Oktober statt.

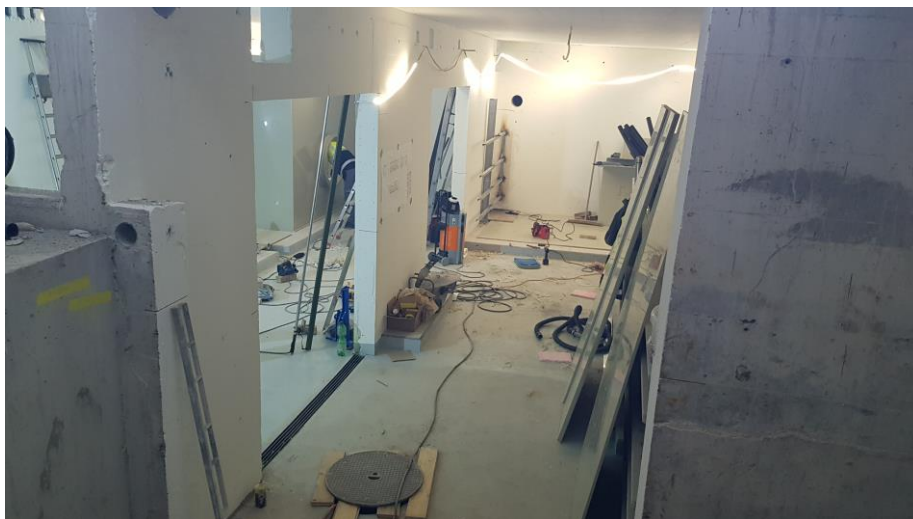

Die Firma E3 HLK AG begann im UG. mit der Montage der Lüftungskanäle.

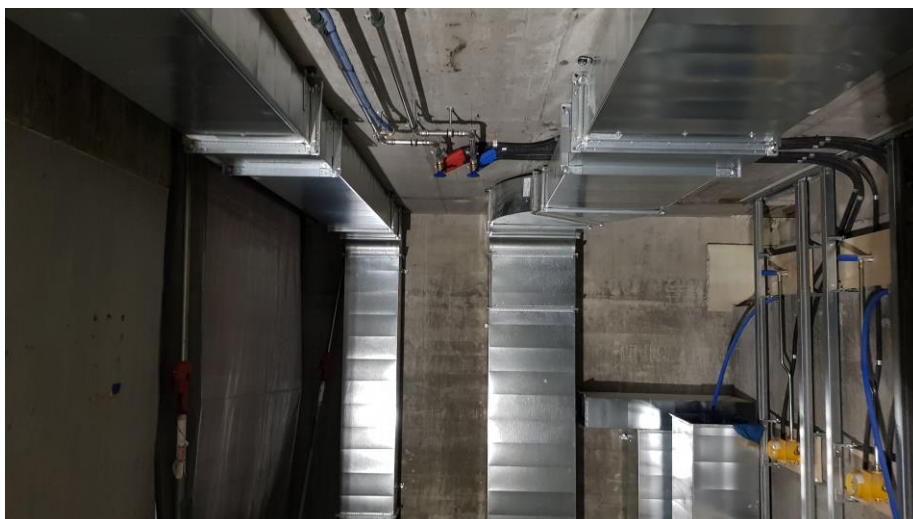

## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Ein Mitarbeiter der Firma Baumann bei der Verlegung der Mosaikplatten in der Zivilschutzanlage.



Die Massnahmen für die Bauaustrocknung kann nächste Woche abgeschlossen werden.



Winterthur, 29. September 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
