

Statusbericht für Bauherr Nr.: 33 (Stand: 20. Oktober 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau). Die Firma Baumann führte weiter Plattenarbeiten aus. Die Firma MS Faustino führte Rückbauarbeiten Im Gebäude aus. In der kommenden Woche wird die Firma Berndorf die Arbeiten im Becken wieder aufnehmen.

1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG führte diese Woche Schalungsarbeiten für das Dach vom Anbau aus. Am 24.10.23 wird die Decke betoniert.




HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

In den Garderoben wurden die Plattenarbeiten weiter fortgesetzt. Dauert die nächsten Wochen noch an.



Die Firmen Fatzer AG und Inauen GmbH Bodenbeläge bauten diese Woche den UB und die Bodenheizung bei den Duschen ein.

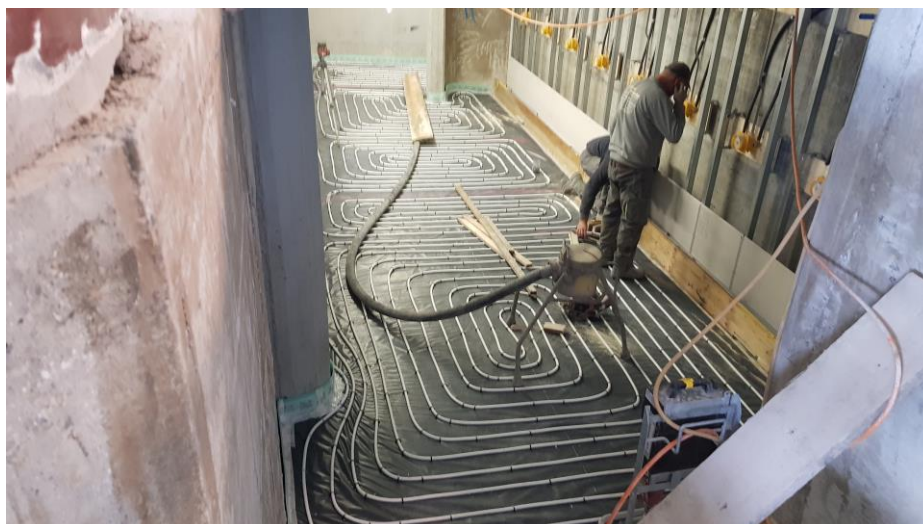

Winterthur, 20. Oktober 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
