

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 41 (Stand: 19. Januar 2024)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo


Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen, Mettler&Tanner, MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Brandschutz, Fatzer, Inauen und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus.

### 1.3 Foto

Die Arbeiten an der Hallenbaddecke sind momentan eingestellt worden (offenere Entscheid bezüglich Ersatzes der Gipsdecke über Beckenumgang). Die Firma Brandschutz AG begann diese Woche mit den Brandabschottungsarbeiten bei der Hallenbadverglasung.



Ab dem 23.01.24 wird die Firma Rösli AG mit der Deckenmontage beginnen.

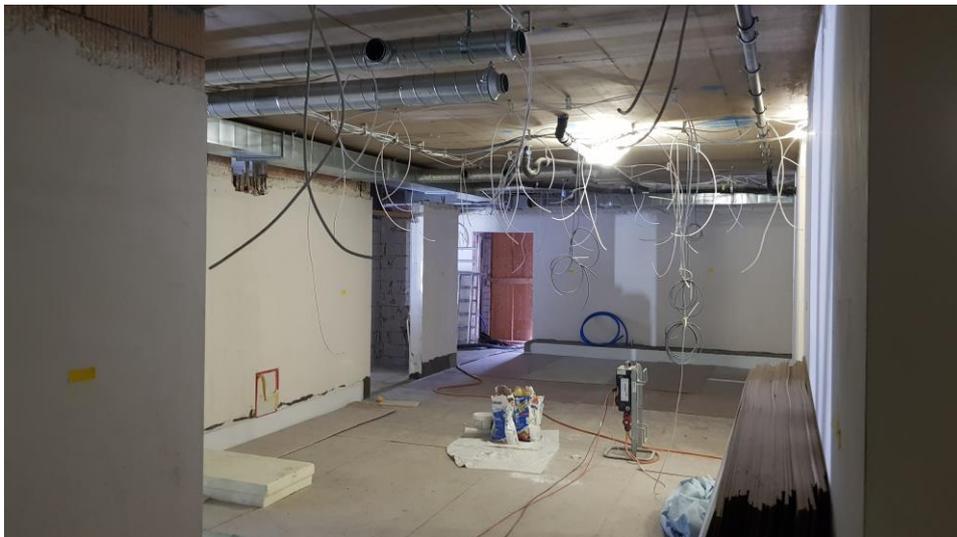

Die Arbeiten an der Kanalisation und Havarischacht konnten diese Woche endlich wieder aufgenommen werden (Zeitverlust für das Fassadengerüst über einen Monat wegen Neukonzept Havarieschacht).



Die Firma Baumann führte weiter Platten - und Abdichtungsarbeiten im Gebäude aus.



Die Firma Inauen und Fatzer bauen diese Woche und in der kommenden Woche die Bodenheizung und den Unterlagsboden beim Kinderplanschbecken ein.



Winterthur, 12. Januar 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
