

Statusbericht für Bauherr Nr.: 44 (Stand: 09. Februar 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Röösl, Fatzer und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Am 12.02.24 wird das bestehende Gerüst im Becken ergänzt. In der kommenden Woche beginnt die Firma Schmid Bedachungen mit den Arbeiten am Anbau. Ab dem 26.02.24 wird das Kinderplanschbecken auf die Dichtigkeit überprüft mit einer 14-tägigen Füllung.

1.3 Foto

Die Firma MS Faustino AG beendete den Rückbau der bestehenden Gipsplatten. Am 16.02.24 wird das Gerüst im Becken aufgestellt für die Sondierungen am Mittelteil.



Die Firma Rösli AG setzte die Arbeiten für die Deckenmontage im Garderobenteil fort.




Im Büro wurde die Unterkonstruktion für die Decke und das Klimagerät montiert.



Die LED-Lampen über der Treppe kommen erst am 26.02.24. Aus diesem Grund muss das Gerüst noch länger stehen als geplant.



Am 26.02.24 wird mit der Probefüllung gestartet (zwei Wochen gefülltes Becken).

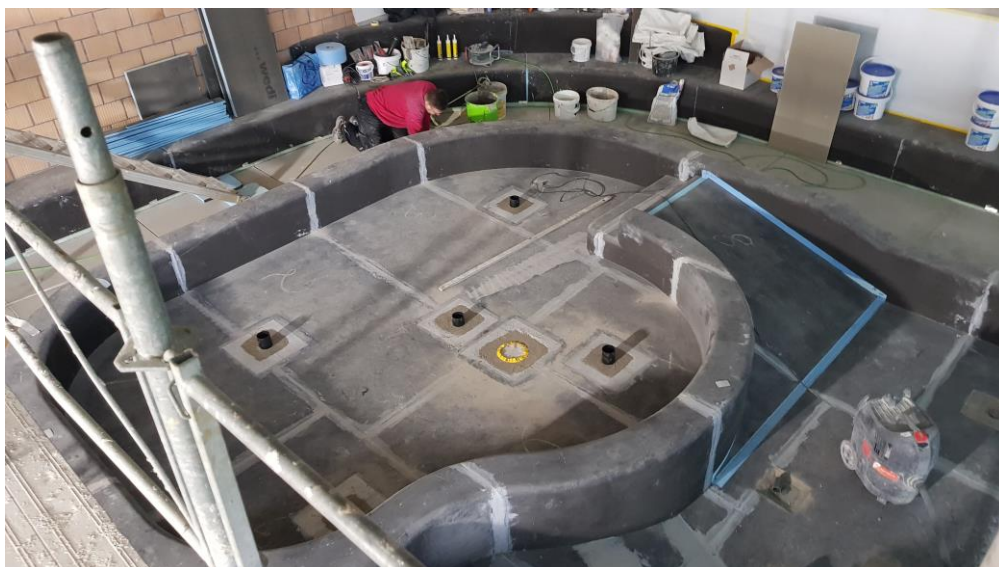

Winterthur, 09. Februar 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
