

Statusbericht für Bauherr Nr.: 49 (Stand: 15. März 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission


1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fatzer, Bawatec, Schmid, Fiorentino, Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Schmid Bedachungen setzte die Arbeiten am Anbau fort. Ab dem 15.03.24 wurde das Kinderplanschbecken nochmals mit Wasser gefüllt (bleibt nochmals eine Woche gefüllt). Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Diese Woche wurden die Verglasungen und die Notausgangstüre im Buchensaal montiert. Danach begannen die Arbeiten an der Fassade. Treppe wird am 27.03.24 montiert.

Einsatz für das Personal (KW 21). Ab dem 21.05.24 wird mit der Beckenfüllung gestartet. Firma Bawatec erstellt einen Einsatzplan (*Zeitnahe wird daher das gewünschte Alarmierungskonzept von der BauKo benötigt*).

1.3 Foto

Die Firma MS Faustino setzte diese Woche die Arbeiten fort (Grundputzarbeiten, Deckenarbeiten).

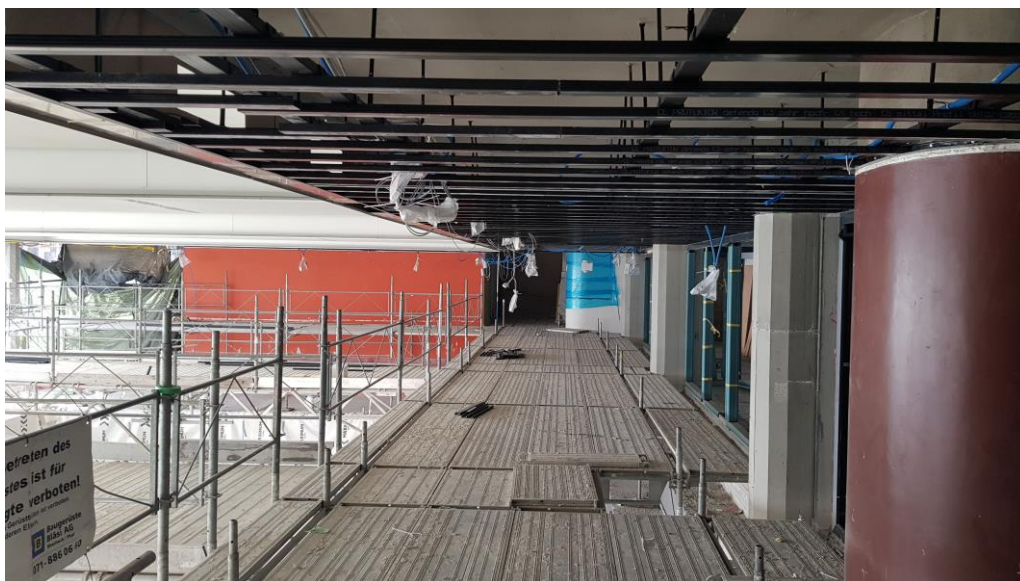

Die erste Baureinigung im Technikumgang wurde ausgeführt.



Die Probefüllung wird nochmals um eine Woche verlängert. Es werden momentan Abklärungen durchgeführt (Ausschlussverfahren) wegen einer noch unbekanntem Undichtigkeit beim Becken (Leitungen können schon ausgeschlossen werden).



Mit der Wiedermontage der Fassadenverkleidung beim Lift und Buchensaal wurde diese Woche begonnen.



Die Montagearbeiten an der Unterkonstruktion und Dämmung der Fassade (Anbau) wurden fortgesetzt.



Winterthur, 15. März 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
