

Statusbericht für Bauherr Nr.: 53 (Stand: 19. April 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Steiner, Weber Metallbau, Falk, Rösli und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst am 03.05.24 werden die nächsten Wochen andauern. Ab dem 02.04.24 begann die Firma Weber Metallbau Türen und Verglasungen einzubauen (Arbeiten dauern noch an). In der KW 17 beginnt die Firma Mettler&Tanner mit den Arbeiten am Retentionsbecken.

1.3 Foto


Die Firma Rösli AG beendete vorläufig die Arbeiten an den Decken.



Die Firma Fiorentino GmbH montiert aktuell die Sanitärinstallationen in den Duschen.




Seit dem 15.04.24 sondiert die Firma Krüger AG nach dem möglichen Leck im KPB. Aktuell läuft die Bodenaustrocknung.

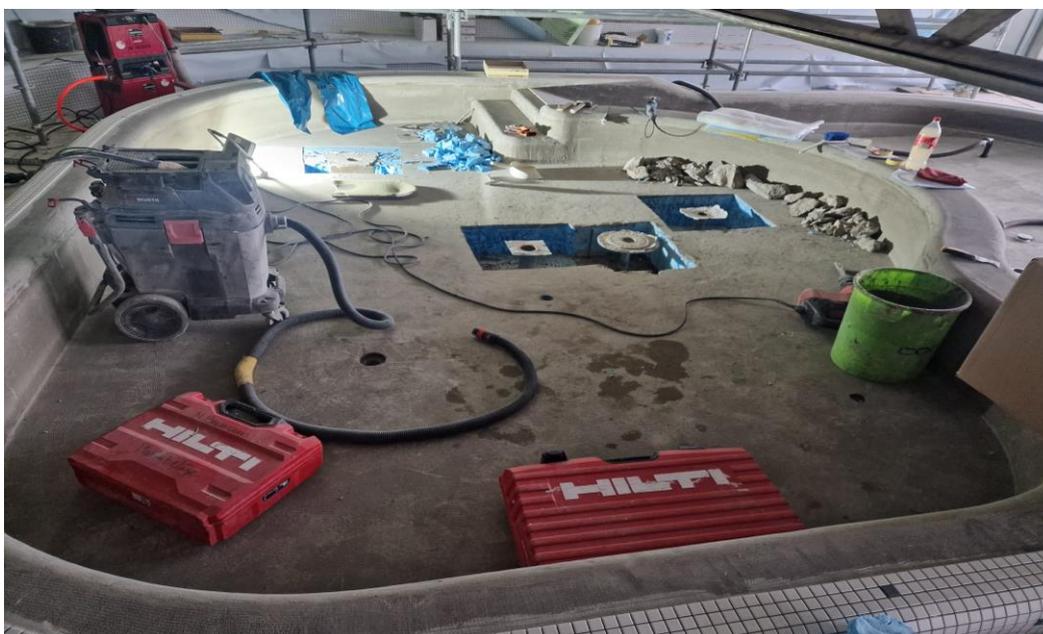

Das neue Büro steht vor der Fertigstellung.



Die neuen Fassadenelemente wurden montiert.

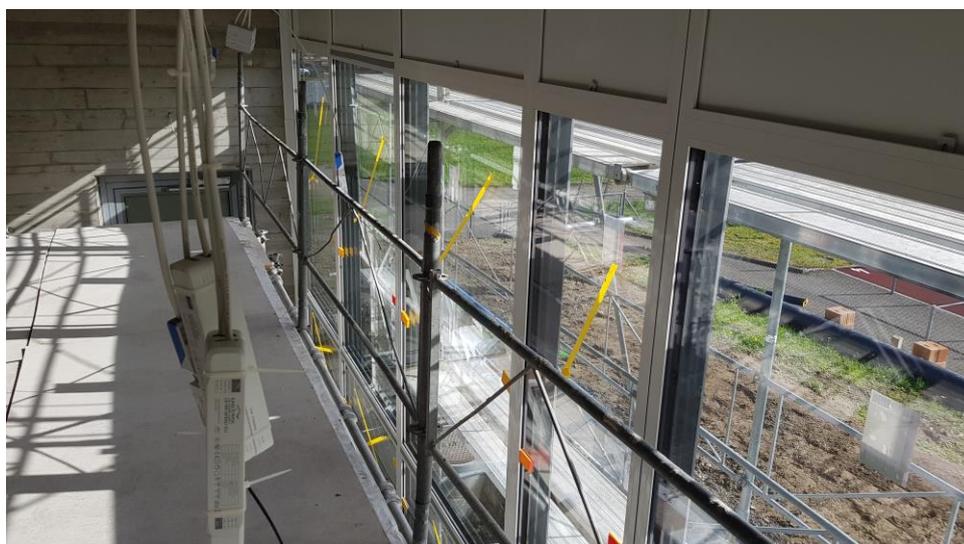

Winterthur, 19. April 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
