

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 61 (Stand: 24. Juni 2024)

### **1.1 Verteiler**

Mitglieder der Baukommission

### **1.2 Projektinfo**

Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Ab dem 17.06.24 wurde die prov. IBN durchgeführt. Nicht wie gefordert über zwei Wochen da aufsteigende Feuchtigkeit in der neuen Abdichtung gesichtet worden ist. In der KW 27 wird die Firma Berndorf den Beckenboden ausbauen. Einbau vom neuen Boden in der KW 29/30.

### **1.3 Foto**

Nach der Probefüllung vom KPB wurde durch den beigezogenen Berate (über die Firma Baumann) aufsteigende Feuchtigkeit in der neuen Abdichtung festgestellt. Die Abdichtung muss wiederholt abgeschliffen und ersetzt werden.




## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Arbeiten an der Deckenergänzung beim KPB kann am 28.06.24 abgeschlossen werden. Rückbau Gerüst am 01.07.24.



Bis am 29.06.24 wird der Plattenbelag auf diese Seiten verlegt sein.

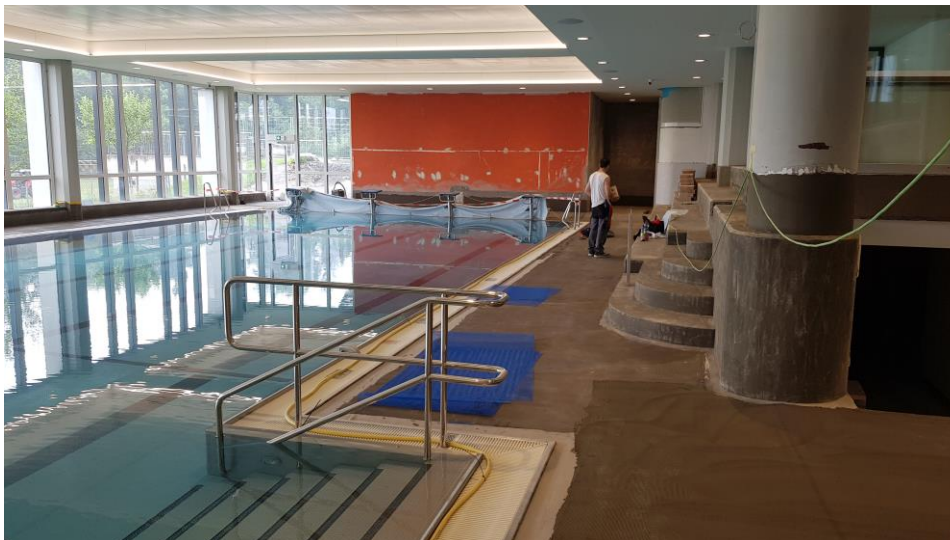

Winterthur, 24. Juni 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
