

Statusbericht für Bauherr Nr.: 62 (Stand: 28. Juni 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. In der KW 27 wird die Firma Berndorf den Beckenboden ausbauen. Ab dem 01.07.24 wird die Fassade beim Anbau montiert. Die Flachdachbegrünung wurde schon ausgeführt. Einbau vom neuen Boden in der KW 29/30. Ab dem 15.07.24 wird die Endreinigung in den Garderoben, Duschen, Zivilschutzanlage und angrenzende Räume ausgeführt und die Umgebungsarbeiten beim Anbau starten.

1.3 Foto


Die Probebefüllung wird in der kommenden Woche ausgeführt. Die neue Abdichtung wurde diese Woche eingebaut.



Die Arbeiten an der Deckenergänzung sind abgeschlossen. Rückbau Gerüst am 01.07.24.



Bis am 29.06.24 wird der Plattenbelag auf diese Seiten verlegt sein.

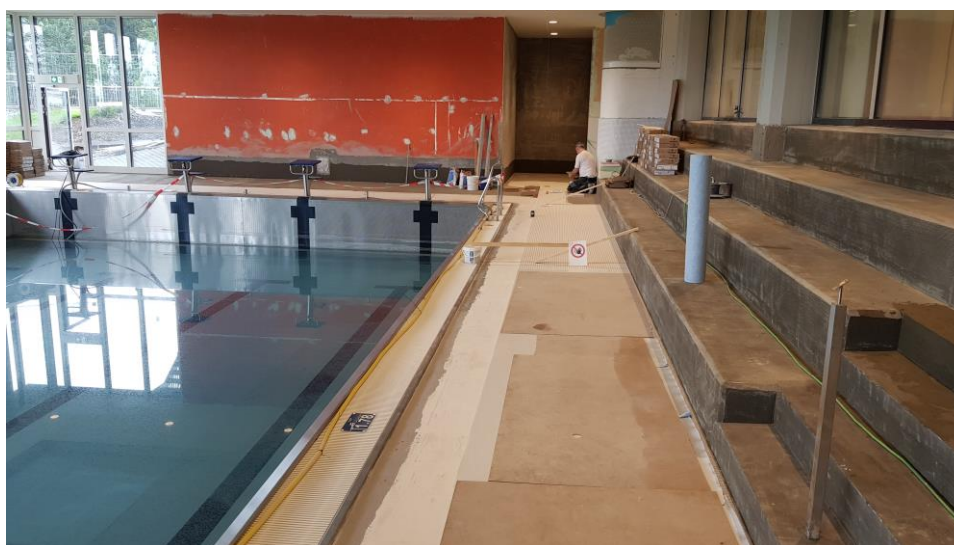

Winterthur, 28. Juni 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
