

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 65 (Stand: 26. Juli 2024)

### 1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Baumann führte weiter Plattenarbeiten aus (dieses Wochenende durchgehend). Die Firmen Steiner und Faustino setzten die Arbeiten weiter fort. Der Aus- und Einbau vom neuen Beckenboden konnte planmässig abgeschlossen werden. Ab dem 29.07.24 beginnt die Endreinigung im Hallenbad. Die Umgebungsarbeiten starten nächste Woche und die Firma Lehmann setzt die Arbeiten an letzten Installationen fort. Kleinere Pendenzen werden durch Unternehmer erst nach dem 05.08.24 ausgeführt (Betriebsferien).

### 1.3 Foto

Das Kinderplanschbecken vor der Fertigstellung.

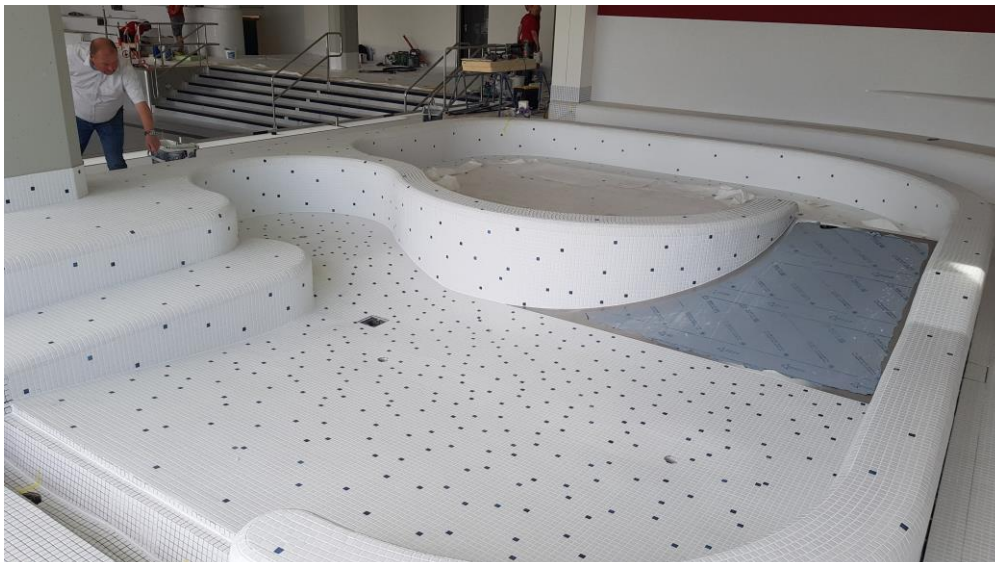

Der neue Beckenboden wurde planmässig ersetzt und die Abnahme fand statt.



Die Firma n-tree montierte rechtzeitig die seitlichen Absperrungen beim Drehkreuz.



Die geplanten Umgebungsarbeiten wurden um eine Woche verschoben (offener Entscheid).  
Unternehmer wurde diesbezüglich schon in Kenntnis gesetzt.



Fertigstellung der Plattenarbeiten nächste Woche. Baureinigung Hallenbad startet am 29.07.24.



Winterthur, 26. Juli 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)
