

Statusbericht für Bauherr Nr.: 6 (Stand: 24. März 2023)

1.1 Verteiler


Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Schadstoffsanierung in der Zone 3 ist am Wochenende abgeschlossen. Leider konnten die geplanten Rückbauarbeiten im Hallenbad noch nicht durch die Diamtbohr AG (Sub) aufgenommen werden. Ab der nächsten Woche können die Baumeisterarbeiter endlich wieder aufgenommen werden. Der Zeitverlust von rund eineinhalb Monate wird sich natürlich auf den Gesamtterminplan auswirken. Der eingeplante Zeitrahmen und Puffer für die Wiederaufbauarbeiten nach dem gesamten Rückbau im Hallenbad und dem Montagestart der Firma Berndorf wurde zur Gänze aufgebraucht. Mit der Firma Berndorf ist man schon diesbezüglich im Gespräch.

1.3 Foto

Die Asbestsanierung in der Zone 3 kann am 27.03.23 abgeschlossen werden. Wie in den letzten Zonen wird die Nachkontrolle durch die Firma Triatec erfolgen. In der nächsten Woche starten die Arbeiten in der Zone 4 (Garderobe/Dusche).

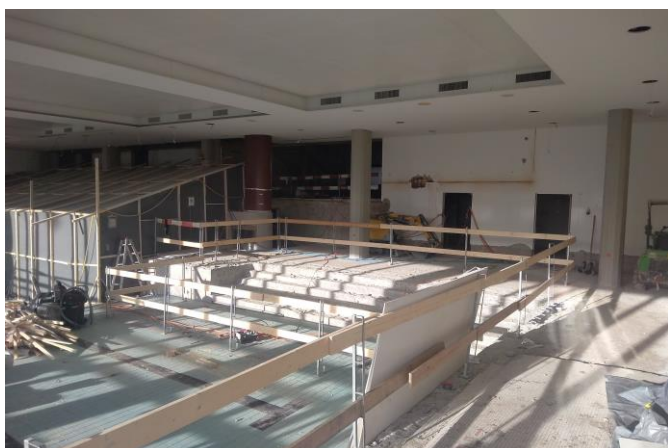

Winterthur, 24. März 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch
